

RICHARD ALFONSO AGUILAR VILLA
GOBERNADOR DE SANTANDER

CLAUDIA YANETH TOLEDO BERMUDEZ
SECRETARIA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA


JUNIO DE 2013



GOBIERNO DE *la gente*

SECTORES

PRESUPUESTO	VIAS	ELECTRIFICACION	GAS	AGUAS	EQUIPAMIENTO	TOTAL
DEFINITIVO	84.027.426.014,99	7.927.717.329,14	3.522.189.125,00	32.287.093.946,50	21.344.619.655,81	145.586.856.946,44
EJECUTADO	59.742.931.671,03	5.101.548.574,90	3.522.189.125,00	28.383.837.899,42	15.433.466.410,20	108.661.784.555,00
POR EJECUTAR	24.284.494.343,96	2.826.168.754,24	000.0000.00	3.903.256.047,08	5.911.153.245,61	36.925.072.392,66

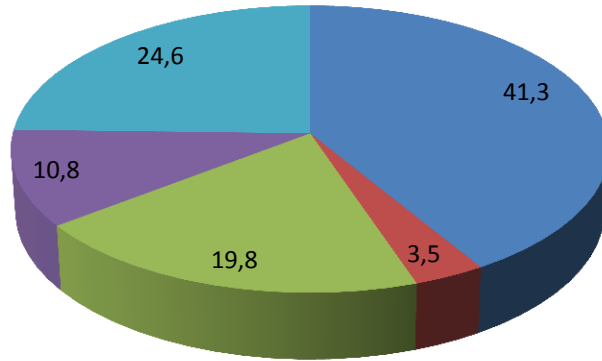

■ VIAS 84.027.426.014,99

■ ELECTRIFICACION
7.927.717.329,14

■ AGUAS 32.287.093.946,50

■ EQUIPAMIENTO
21.344.619.655,81

■ NO EJECUTADO
35.838.504.555,27

AVANCE DE METAS PLAN DE DESARROLLO CON CORTE A MAYO 31 DE 2013

2. AVANCE METAS PLAN DE DESARROLLO POR SECTORES VIGENCIA 2012

2.1 AGUAS Y SANEAMIENTO BASICO



LINEA ESTRATÉGICA SANTANDER SUSTENTABLE

PROGRAMA	META DE PRODUCTO	NOMBRE DE INDICADOR	PROGRAMADO 2012	EJECUTADO 2012	% EJECUCIÓN META
Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de Sistemas del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico.	Apoyar la construcción de 2 acueductos regionales.	No. De acueductos regionales	0	0	0.0%
	Construir, mejorar y/o optimizar 50 sistemas de acueducto urbano y/o rural en los municipios del Departamento	No. De sistemas construidos, mejorados y/o optimizados	10	06	60.0%
	Construir , optimizar y/o mejorar 32 sistemas de alcantarillado urbano y/o rural en los municipios del Departamento	No. De sistemas de alcantarillado construidos, mejorados y/o optimizados	6	5	83.3%
	Construir, mejorar , optimizar y equipar 10 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)	No. De PTAR en funcionamiento	0	0	0.0%

LINEA ESTRATÉGICA SANTANDER SUSTENTABLE

PROGRAMA	META DE PRODUCTO	NOMBRE DE INDICADOR	PROGRAMADO 2012	EJECUTADO 2012	% EJECUCIÓN META
Mejor Disposición de los Residuos Sólidos	Apoyar la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIR) en 20 o más municipios del Departamento.	Nº de municipios apoyados con PGIR.	2	0	0.0%
	Apoyar a 3 municipios y/o entidades prestadoras en el manejo, tratamiento, transformación y disposición de residuos sólidos	Nº de municipios y/o entidades apoyados.	1	0	100.0%
	Construir, mejorar, optimizar y equipar 3 Plantas Transformadores de Residuos Sólidos.	Nº de Plantas de tratamiento en funcionamiento.	0	0	00.0%

LINEA ESTRATÉGICA SANTANDER SUSTENTABLE

PROGRAMA	META DE PRODUCTO	NOMBRE DE INDICADOR	PROGRAMADO 2012	EJECUTADO 2012	% EJECUCIÓN META
Asistencia Técnica y Equipamiento para Mejorar la Calidad del Agua	Capacitar, asesorar y orientar a 30 entidades administradoras de servicios públicos domiciliarios (empresas y/o municipios) en áreas legales, técnicas, administrativas y comerciales.	Nº de entidades capacitadas, asesoradas y orientadas.	10	10	100.0%
	Adquirir 20 equipos de laboratorio para el muestreo, diagnóstico y cuantificación de la calidad y cantidad del agua.	Nº de equipos de laboratorio adquiridos.	5	0	0.0%
	Realizar en 40 acueductos el diagnóstico de la calidad del agua tanto en la fuente como en el punto final de tratamiento y/o entrega del suscriptor.	Nº. de acueductos con diagnóstico realizado.	10	10	100.0%

CONTRATACION

AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			
ADICIONALES A CONTRATOS Y CONVENIOS VIGENCIAS ANTERIORES			
MUNICIPIO	OBJETO	APORTE DEPARTAMENTO	ESTADO
CONTRATACION	INTERVENTORIA, CONSTRUCCION ALCANTARILLADO CASCO URBANO MUNICIPIO DE CONTRATACION, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	68.663.462,00	EJECUCION 80%
PIEDECUENTA	INTERVENTORIA. OPITIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR CENTRO, DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUENTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	44.905.502,40	LIQUIDADO
PIEDECUENTA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NOR-OCCIDENTAL FASE I DEL MUNICIPIO DE PIEDECUENTA SANTANDER.	647.021.572,00	LIQUIDADO
PIEDECUENTA	CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA EL GRANADILLO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUENTA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	233.999.999,00	TERMINADO POR LIQUIDAR
PIEDECUENTA	INTERVENTORIA A LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NOR-OCCIDENTAL FASE I DEL MUNICIPIO DE PIEDECUENTA SANTANDER	33.549.267,00	POR LIQUIDAR
SABANA DE TORRES	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO LA GOMEZ Y AMPLIACION DE LA RED DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, SANTANDER.	239.963.334,00	TERMINADO POR LIQUIDAR
SAN ANDRES	REPOSICION PARCIAL Y AMPLIACION REDES SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES	314.433.675,00	TERMINADO POR LIQUIDAR
SAN ANDRES	INTERVENTORIA REPOSICION PARCIAL Y AMPLIACION DE REDES SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SANTANDER	16.294.000,00	TERMINADO POR LIQUIDAR
SAN GIL	AMPLIACION SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER.	358.518.140,00	TERMINADO POR LIQUIDAR
SAN GIL	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION SECTOR BAJO BARRIOS RAGONESSY, VERGEL, MARIA AUXILIADORA, SAN ANTONIO Y CENTRO ACUEDUCTO MUNICIPAL, SAN GIL, SANTANDER	439.898.981,09	TERMINADO POR LIQUIDAR
VILLANUEVA	CONSTRUCCION PRESA EN TIERRA PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA PRESA DE LA PAMPA, MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	446.254.312,00	EJECUCION 85%
TOTAL		2.843.502.244,49	

AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			
CONVENIOS CELEBRADOS CON RECURSOS DE LA VIGENCIA 2012			
MUNICIPIO	OBJETO	APORTE DEPARTAMENTO	ESTADO
CEPITA	CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO MIRAFLORES VEREDA MIRAFLORES, MUNICIPIO DE CEPITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	728.227.046,00	PROCESO DE ADJUDICACION
CHARTA	CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA URBANIZACION VILLA SUAREZ , MINICIPIO DE CHARTA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	410.077.603,74	EJECUCION 15%
CIMITARRA	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL URBANIZACION RAMON SANTAMARIA MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	360.271.658,49	PROCESO DE ADJUDICACION
DEPARTAMENTO	IMPLEMENTACION PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS	20.315.724.153,00	EJECUCION 75%
LEBRIJA	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER	219.965.000,00	VPROCESO DE LEGALIZACION
LEBRIJA	REPOSICION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLDO EN LA ZONA URBANASEGUN EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER	1.565.230.286,70	PROCESO DE LICITACION.
TOTAL		\$23.599.495.747,93	

AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			
CONTRATOS CELEBRADOS CON RECURSOS DE LA VIGENCIA 2012			
MUNICIPIO	OBJETO	APORTE DEPARTAMENTO	ESTADO
BUCARAMANGA - GIRON	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA REPOSICION DEL ALCANTARILLADO BARRIO ALTOS DE ARENALES, MUNICIPIO DE GIRON Y CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL BARIO EL CRISTAL PARTE BAJA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	1.940.665.516,00	INICIA JUNIO 24-2013
TOTAL		\$1.940.665.516,00	
TOTAL AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		28.383.665.508,42	



PROYECTOS OCAD

MUNICIPIO	OBJETO	VALOR	ESTADO
VELEZ	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO ETAPA I CASCO URBANO	2.200.000.000,00	PROCESO CONTRATACION

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO – PDA - PAP



OBRAS EN EJECUCION

PROYECTOS PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS OBRAS EN EJECUCION- RECUROS 2012



No. CONTRATO	VALOR	OBJETO	MUNICIPIO	ESTADO	% AVANCE OBRA
1921	\$ 244.001.158	RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	MOLAGAVITA	PROCESO DE LIQUIDACION.	100%
2003	5.514.019.016,22	OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE VÉLEZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	VELEZ	EJECUCION	90%
2120	19.254.144,00	INTERVENTORIA CONSTRUCCION DEL SISTEMA MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE OCAMONTE, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	OCAMONTE	EN PROCESO DE LIQUIDACION.	100%
2125	\$ 595.225.185,00	INTERVENTORÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE VÉLEZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	VELEZ	EJECUCION	90%
2189	12.823.800,00	INTERVENTORIA CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA MOTOSO, MUNICIPIO SAN JUAN GIRON, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	GIRON	EJECUCION	90%
2238	258.275.778,67	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MAESTRO ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE OCAMONTE, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	OCAMONTE	EN PROCESO DE LIQUIDACION.	100%
2363	224.901.225,00	CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA MOTOSO, MUNICIPIO SAN JUAN GIRON, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	GIRON	EJECUCION	90%
2461	2.513.696.610,80	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y RED DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO YARIMA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	TERMINADO	100%
2495	1.707.587.622,42	PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL MUNICIPIO DE PINCHOTE, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	PINCHOTE	EJECUCION	60%
2499	186.757.100,00	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y RED DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO YARIMA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	PROCESO DE LIQUIDACION.	100%
2503	126.881.163,17	INTERVENTORÍA PARA EL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL MUNICIPIO DE PINCHOTE, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	PINCHOTE	EJECUCION	60%
TOTAL			\$11.403.422.803		

PROYECTOS PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS OBRAS EN EJECUCION



No.	VALOR	OBJETO	MUNICIPIO	ESTADO	% AVANCE OBRA
2470	\$ 9.540.934.318,62	CONSTRUCCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE ABASTECIMIENTO PARA EL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE BARICHARA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	BARICHARA	SUSPENDIDOSE ENCUENTRA EN AJUSTE Y REVISION DE LOS DISEÑOS	0%
1284	\$3.791.066.835	OPTIMIZACION Y MODERNIZACION DE LAS REDES HIDRAULICAS DE DISTRIBUCION EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER - PRIMERA ETAPA	MALAGA	Liquidado	100%
1949	\$386.528.452,90	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO PEÑA COLORADA DEL MUNICIPIO DE ENCISO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	ENCISO	En PROCESO DE LIQUIDACION	100%
1334	\$938.440.252.14	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO ACAPULCO MUNICIPIO DE GIRON, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	GIRON	EN PROCESO DE LIQUIDACION	100%
2146	\$1.540.754.730	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CERRITO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	CERRITO	EN PROCESO DE LIQUIDACION.	100%
1341	877.890.675.90	CONSTRUCCION SISTEMA PRINCIPAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE CERRITO SANTANDER	CERRITO	EN EJECUCION	5%

PROYECTOS PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS OBRAS EN EJECUCION



No.	VALOR	OBJETO	MUNICIPIO	ESTADO	% AVANCE OBRA
2490	\$ 2.781.278.359,43	PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	PALMAS DEL SOCORRO	Liquidado	100%
2505	\$ 2.518.708.744,65	PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BETULIA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	BETULIA	EJECUCION	90%
284	\$ 458.363.345,77	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOCORRO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	SOCORRO	PROCESO DE LIQUIDACION.	100%
2168	\$ 529.596.509,30	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE ENCINO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	ENCINO	EJECUCION	90%
2103	\$ 5.970.317.847,00	PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	ZAPATOCA	EJECUCION	90%
-	\$ 192.938.708,00	PLAN MAESTRO DEL ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"	LA FUENTE	ADJUDICADO -EN LEGALIZACION	-

PROYECTOS PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS OBRAS EN EJECUCION



No. CONTRATO	VALOR	OBJETO	MUNICIPIO	ESTADO	% AVANCE OBRA
1282	1.144.910.562,00	CONSTRUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA COLINA, LA ESPERANZA Y BUENOS AIRES DE LA MESA DE RUITOQUE DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	PIEDRECUESTA	SUSPENDIDO	87%
1330	\$ 448.628.354,22	CONSTRUCCION TERMINACION ACUEDUCTO VEREDA CORBARAQUE, MUNICIPIO DE SUAITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	SUAITA	PROCESO DE LICITACION POR PARTE DEL MUNICIPIO	-
2231	\$ 193.931.387,30	INTERVENTORÍA PARA: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CERRITO, CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO PEÑA COLORADA DEL MUNICIPIO DE ENCISO, OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GALÁN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y SISTENA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER..	CERRITO, ENCISO. GALAN Y MOLAGAVITA	EN PROCESO DE LIQUIDACION	80%
370	5.999.716.422,00	RECONSTRUCCION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL (PLAN MAESTRO) EN EL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	LA BELLEZA	SUSPENDIDO POR LLUVIAS.	52%
2462	330.107.044.42	PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MACARAVITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	MACARAVITA	EJECUCION	60%
2118	24.313.600,00	INTERVENTORIA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MACARAVITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	MACARAVITA	EJECUCION	60%
2474	\$ 544.720.652,62	EL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAVATA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	GUAVATA	EJECUCION	5%
2823	\$ 958.977.326,00	PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL FASE 1	PUENTE NACIONAL	EJECUCION	5%

PROYECTOS PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS OBRAS EN EJECUCION



AÑO	No.	VALOR	OBJETO	MUNICIPIO	ESTADO	% AVANCE OBRA
2013	3152	\$ 124.373.186,00	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE GALÁN; ESTUDIOS, DISEÑOS Y PROYECTO PARA LOS ACUEDUCTOS VEREDALES LAS VUELTAS, PEÑAGRANDE, BOQUERON, SAN ISIDRO, EL HOBBO, LA AGUADA, Y EL ALTO DEL MUNICIPIO DE GALAN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER; ESTUDIO Y DISEÑOS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS DE HATO Y SIMACOTA UBICADAS EN LA JURISDICCIÓN QUEBRADA LA 5.000 DEPARTAMENTO DE SANTANDER; ESTUDIO, DISEÑOS Y PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DENTRO DEL MARCO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS Y EL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ESTUDIO, DISEÑOS Y PROYECTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS RURALES DE LAS VEREDAS ASTILLEROS, CERRITOS, JAZMIN, SABANA GRANDE, CAFETO, CARARITO, LOMA DE CANDELA, GUALILO, SANTA HELENA, CORREGIMIENTO EL PORVENIR, CENTRO POBLADO ARALES Y EL LIBANO"	GALAN , LA PAZ , SUCRE, HATO, SIMACOTA,	EN EJECUCION	5%
2013	2977	\$931,592,529	OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"	LOS SANTOS	EN EJECUCION	5%
2013	3275	\$ 228.353.264,00	"OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	GUADALUPE	EN LEGALIZACION	-
2013	3316	\$ 124.373.186,00	INTERVENTORIOA PARA EL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO MUNICIPIO DE VETAS, DEPARTAMENTO DE SANTANDER; INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTRILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL PALMAR; INTERVENTORIA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE CONFINES, DEPARTAMENTO DE SANTANDER; INTERVENTORIA PARA LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE , DEPARTAMENTO SDE SANTANDER	VETAS, GUADALUPE , PALMAR	EN LEGALIZACION	-
2013	3421	8650012466	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER - SECRETARIA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA Y EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. PARA LA CONSTRUCCION OBRAS DE ACUEDUCTO PARA EL DISTRITO DE BAHONDO DEL MUNICIPIO DE GIRON	GIRON	EN LEGALIZACION	-

PROYECTOS PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS OBRAS EN EJECUCION




No.	VALOR	OBJETO	MUNICIPIO	ESTADO	% AVANCE OBRA
1325	\$160.713.360,00	INTERVENTORÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CORREGIMIENTO GUANE DEL MUNICIPIO DE BARICHARA E INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO INTERCEPTOR DEL MUNICIPIO DE CERRITO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	BARICHARA - CERRITO	EN EJECUCION	10%
2234	\$116.223.880,00	INTERVENTORIA PARA LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILADO DEL CENTRO POBLADO DE BERLIN DEL MUNICIPIO DE TONA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	TONA	SUSPENDIDO - SERVIDUMBRES	95%
1600	\$6.555.297.664,00	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL SANTUARIO ETAPA 1 FASE 3 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER	PIEDRECUESTA	EN EJECUCION	80%
2056	\$420.000.000,00	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION Y PROTECCION A LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO	CAPITANEJO	POR INICIAR	0%
2995	\$230.304.827,00	INTERVENTORIA PARA LA OPTIMIZACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, DEPARTAMENTO DE SANTANDER; INTERVENTORIA PARA EL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAVATA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER; INTERVENTORIA PARA EL PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE GUEPSA, SEPARTAMENTO DE SANTANDER E INTERVENTORIA PARA EL PLAN MAESTRO DE ACUEDCUTO DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL FASE I.	LOS SANTOS GUAVATA GUEPSA Y PUENTE NACIONAL	POR INICIAR	0%

PROYECTOS PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS OBRAS EN EJECUCION -



No . CONTRATO	VALOR	OBJETO	MUNICIPIO	ESTADO	% AVANCE OBRA
1896	\$63.842.935	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE BARICHARA.	BARICHARA	EN PROCESO DE LIQUIDACION.	100%
1973	\$184.803.080,00	INTERVENTORIA PARA LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MATANZA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	MATANZA	EN PROCESO DE LIQUIDACION	100%
2320	\$529.097.151,91	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL HATO DEPARTAMENTO DE SANTANDER	HATO	EN EJECUCION	35%
2	\$107.833.600,00	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA ALTERNA DE CONDUCCIÓN, ALMACENAMIENTO, MACROMEDICION Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	CHARALA	EN EJECUCION	80%
2690	\$1,405,660,377	“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL ACUERDUCTO REGIONAL DE CHICAMOCHA”	LOS SANTOS	EJECUCION	25%
TOTAL			\$2.291.237.103,91		

PROYECTOS PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS OBRAS EN EJECUCION

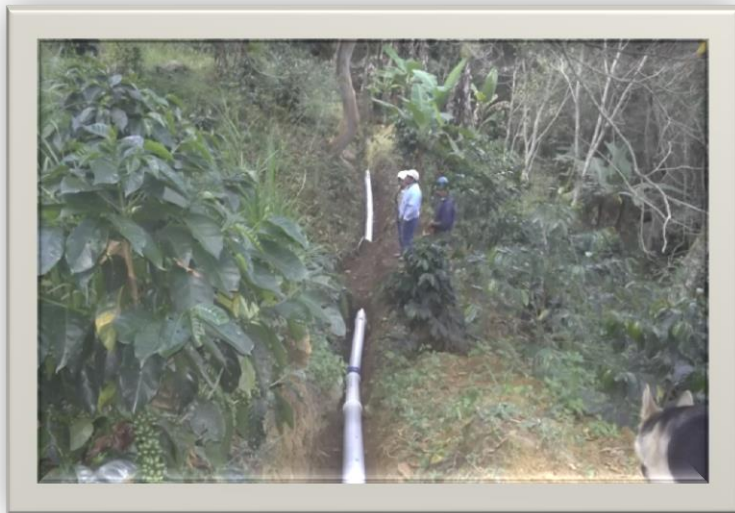

CONDUCCION RED DE AGUA
POTABLE – MUNICIPIO DE
ZAPATOCA

CONSTRUCCION RED DE
ALCANTARILLADO -
MUNICIPIO DE ENCISO



GOBIERNO DE *la gente*



GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES



Infraestructura y
Competitividad
GOBIERNO DE *la gente*

GOBIERNO DE *la gente*





LINEA ESTRATEGICA: SANTANDER EQUILIBRADO Y ORDENADO

Programa Modernización de la Infraestructura del Equipamiento Urbano

**Secretaria de Transporte e Infraestructura
Grupo de Proyectos Especiales**

Presupuesto Sector Equipamiento Urbano vigencia 2012

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	EQUIPAMIENTO
DEFINITIVO	21.344.619.655,81
EJECUTADO	15.669.486.530,11
POR EJECUTAR	5.675.133.125,70



Programa Modernización de la Infraestructura del Equipamiento Urbano



Polideportivo barrio Kennedy



Coliseo Municipal de Puerto Parra





Polideportivo Parque las Palmas, Girón



Coliseo Municipal de Barichara

GOBIERNO DE *la gente*



METAS DE PRODUCTO

METAS DE PRODUCTO	META CUATRIENIO	PROGRAMADO 2012	EJECUTADO 2012	Municipios Beneficiados
<p>Construir, mejorar, apoyar y mantener 15 proyectos de equipamiento municipal para el desarrollo económico, social e institucional.</p> <p>Indicador: Numero de equipamientos construidos, mejorados, apoyados y mantenidos.</p>	15	3	9	Parques Infantiles Área Metropolitana Cancha Barrio Kennedy Voz y Datos STI
<p>Adecuar, remodelar o mantener la Unidad Deportiva Alfonso Lopez (áreas deportivas, administrativas, sociales, comerciales y de acceso).</p> <p>Indicador: Unidad deportiva adecuada o remodelada</p>	1	1	1	Unidad Deportiva Alfonso Lopez (Bucaramanga)
<p>Construir, mejorar y adecuar 8 parques, plazas y/o plazoletas municipales en Santander.</p> <p>Indicador: Numero de equipamientos construidos, mejorados y adecuados.</p>	8	3	4	El Carmen de Chucuri Cepita Los Santos Área Metropolitana
<p>Construir o mejorar 3 plazas de feriar y/o eventos municipales.</p> <p>Indicador: Numero de plazas construidos o mejorados.</p>	3	0	0	

Programa Modernización de la Infraestructura del Equipamiento Urbano

METAS DE PRODUCTO

METAS DE PRODUCTO	META CUATRIENIO	PROGRAMADO 2012	EJECUTA DO 2012	Municipios Beneficiados
<p>Construir o mejorar 4 plazas de mercado municipales-</p> <p>Indicador: Numero de plazas construidos o mejorados.</p>	4	1	1	Charalá
<p>Cofinanciar la construcción, mejoramiento y/o adecuación de 10 proyectos de equipamiento entre salones comunales, múltiples, restaurantes escolares, parques infantiles, casas campesinas, centros de acopio, centros de atención a la primera infancia, centros de vida.</p> <p>Indicador: Numero de equipamientos atendidos.</p>	10	2	1	Área Metropolitana
<p>Cofinanciar la construcción, mejoramiento o adecuación de 4 palacios municipales.</p> <p>Indicador: Numero de palacios municipales cofinanciados.</p>	4	1	0	
<p>Mejorar, mantener o construir 65 escenarios deportivos o canchas polideportivas.</p> <p>Indicador: Numero de escenarios deportivos o canchas mejorados, mantenidos o construidos.</p>	65	10	10	Keneddy (Bucaramanga) Gambita - Málaga Lebrija (2)- Vetas Aratoca – Barichara – Chipata Cimitarra

Programa Modernización de la Infraestructura del Equipamiento Urbano

GOBIERNO DE *la gente*

METAS DE PRODUCTO

METAS DE PRODUCTO	META CUATRIENIO	PROGRAMADO 2012	EJECUTADO 2012
<p>Construir, mejorar o adecuar un parque de orden temático sistémico regional o municipal en Santander.</p> <p>Indicador: Parque construido, mejorado o adecuado</p>	1	1	0
<p>Realizar 4 estudios y diseños de espacio y equipamientos públicos</p> <p>Indicador: Numero de estudios diseñados.</p>	3	1	0

Programa Modernización de la Infraestructura del Equipamiento Urbano

ADICIONALES A CONTRATOS Y CONVENIOS VIGENCIAS ANTERIORES

MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION	ESTADO
ARATOCA	Construcción coliseo cubierto en la unidad deportiva del municipio de Aratoca Departamento de Santander.	\$ 33.246.242,91	Margen de Comercialización Prodesarrollo Inversión 25% Inf. Deportiva	LIQUIDADO
BARICHARA	Construcción coliseo cubierto puente grande sector urbano en el municipio de Barichara Departamento de Santander	\$ 369.855179,41	Prodesarrollo Inversión 25% Inf. Deportiva Margen de Comercialización	LIQUIDADO
LEBRIJA	Adicional - Adecuación cancha de futbol municipal- municipio de Lebrija - Santander	\$ 58.672.384,00	ICLD Rec. Bce	LIQUIDADO
MALAGA	Construcción ciudadela deportiva, primera etapa del municipio de Málaga - Santander	\$ 416.950.536,00	Prodesarrollo 25% Infraestructura Deportiva Rec. Balance	LIQUIDADO

Programa Modernización de la Infraestructura del Equipamiento Urbano

GOBIERNO DE *la gente*

ADICIONALES A CONTRATOS Y CONVENIOS VIGENCIAS ANTERIORES

MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION	ESTADO
OIBA	Adecuación coliseo y plaza de ferias del municipio de Oiba - Santander	\$ 226.474.503,00	Margen de Comercialización	LIQUIDADO
OIBA	Interventoria Adecuación coliseo y plaza de ferias del municipio de Oiba - Santander	\$ 11.743.722,00	Margen de Comercialización	LIQUIDADO

**TOTAL ADICIONALES
A CONTRATOS Y CONVENIOS
\$ 1.116.941.967,32**

Programa Modernización de la Infraestructura del Equipamiento Urbano

GOBIERNO DE *la gente*

CONVENIOS CELEBRADOS CON RECURSOS VIGENCIA 2012

MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION	ESTADO
CEPITA	Ampliación y mejoramiento del parque principal del municipio de Cepita – Santander	\$ 806.840.809,50	Margen de Comercialización	PROCESO ADJUDICACION MUNICIPIO
CHARALA	Recuperación y construcción casa de mercado del municipio de Charala, Departamento de Santander afectada por la fuerte temporada de lluvias	\$ 300.000.000,00	Margen de Comercialización	POR INICIAR (ADJUDICADO UNGR)
CHIPATA	Construcción de la unidad deportiva y coliseo del municipio de Chipata Departamento de Santander	\$ 852.441.688,06	Prodesarrollo Inversión 25% Inf. Deportiva	LEGALIZACION CONTRATO OBRA
CIMITARRA	Construcción polideportivo Altos de la Paz del municipio de Cimitarra Departamento de Santander	\$ 123.637.392,00	Utilidades Empresas ESSA	EJECUCIÓN 25% CON ACTA DE INICIO
EL CARMEN DE CHUCURI	Remodelación parque principal municipio de El Carmen de Chucuri – Departamento de Santander	\$ 1.092.818.750,85	Margen de Comercialización	EJECUCION 75%

Programa Modernización de la Infraestructura del Equipamiento Urbano

GOBIERNO DE *la gente*

CONVENIOS CELEBRADOS CON RECURSOS VIGENCIA 2012

MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION	ESTADO
GAMBITA	Adecuación cancha municipal de futbol fase 1, municipio de Gambita	\$ 403.545.086,00	Pro-desarrollo inversión 25% Inf. Deportiva	EJECUCION 90%
LANDAZURI	Construcción villa recreacional del municipio de Landázuri - Santander (fase I)	\$ 750.555.133,90	Margen de Comercialización	PARA FIRMA ACTA INICIO
LOS SANTOS	Remodelación fase II parque principal municipio de Los Santos Departamento de Santander	\$ 250.000.000,00	Margen de Comercialización	LIQUIDADO
VETAS	Adecuación de la cancha de futbol municipal del municipio de Vetas, departamento de Santander	\$ 987.588.427,43	Prodesarrollo 25% Infraestructura Deportiva Rec.Bce	EJECUCION 20%

TOTAL INVERSION RECURSOS PROPIOS \$ 5.567.427.287,74

Programa Modernización de la Infraestructura del Equipamiento Urbano

GOBIERNO DE *la gente*

CONTRATOS CELEBRADOS CON RECURSOS VIGENCIA 2012

MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION	ESTADO
AREA METROPOLITANA	Interventoria para el mejoramiento y mantenimiento de obras de infraestructura para la red de equipamiento urbano y suministro e instalación de mobiliario, en los municipios de Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca del departamento de Santander	\$ 114.593.152,00	Margen de Comercialización	EJECUCION 50%
AREA METROPOLITANA	Mejoramiento y mantenimiento de obras de infraestructura para la red de equipamiento urbano y suministro e instalación de mobiliario, en los municipios de Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca del departamento de Santander	\$ 2.421.328.645,00	Margen de Comercialización	EJECUCION 50%
BUCARAMANGA	Interventoria para el mejoramiento cancha de futbol b. Kennedy cra 12 con calle 16 norte	\$ 68.462.040,00	Margen de Comercialización	EN EJECUCION (20%)
BUCARAMANGA	Mejoramiento cancha de futbol b. Kennedy cra 12 con calle 16 norte	\$ 1.320.033.206,25	Margen de Comercialización	EN EJECUCION (20%)

Programa Modernización de la Infraestructura del Equipamiento Urbano

GOBIERNO DE *la gente*

CONTRATOS CELEBRADOS CON RECURSOS VIGENCIA 2012

MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION	ESTADO
BUCARAMANGA	Suministro e instalación parques infantiles, mantenimiento cancha múltiple en el barrio Kennedy e instalación baranda en el barrio Minuto de Dios del municipio de Bucaramanga	\$ 53.994.811,99	Margen de Comercialización	LIQUIDADO
DEPARTAMENTO	Estudios y diseños prioritarios para la inversión departamental en instituciones educativas del departamento de Santander – Estudios y diseños prioritarios para la inversión departamental en equipamiento urbano del departamento de Santander y Diseños para la inversión en infraestructura de puentes prioritarios de la red vial del departamento de Santander – Estudios, diseños y asesoría para la pavimentación, mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación de tramos viales prioritarios del departamento de Santander	\$ 1.394.408.160,00		EN EJECUCION (60%)
EL CARMEN DE CHUCURI	Interventoría para la remodelación parque principal municipio de El Carmen de Chucuri – Departamento de Santander	\$ 56.505.920,00	Rendimientos I.C.L.D	EJECUCION 75%

Programa Modernización de la Infraestructura del Equipamiento Urbano

CONTRATOS CELEBRADOS CON RECURSOS VIGENCIA 2012

MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION	ESTADO
GAMBITA	Interventoria para la adecuación cancha municipal fase I, municipio de Gambita, Departamento de Santander	\$ 20.419.712,00	Pro-desarrollo inversión 25% Inf. Deportiva	EN EJECUCION 90%
GOBERNACION DE SANTANDER	Adecuación de los espacios y suministro de la red de voz y datos para la secretaria de transporte e infraestructura de la gobernación de Santander	\$ 399.990.922,95	Margen de Comercialización	EJECUCION 80%
LEBRIJA	Construcción coliseo del municipio de Lebrija - Departamento de Santander	\$ 780.990.335,00	Pro-desarrollo inversión 25% Inf. Deportiva	EJECUCION (40%)
LEBRIJA - VETAS	Interventoria para la Construcción coliseo del municipio de Lebrija - Departamento de Santander y la Adecuación de la cancha de futbol municipal del municipio de Vetas, departamento de Santander	\$ 137.683.010,00	Pro-desarrollo inversión 25% Inf. Deportiva	EJECUCION (30%)

Programa Modernización de la Infraestructura del Equipamiento Urbano

GOBIERNO DE *la gente*

CONTRATOS CELEBRADOS CON RECURSOS VIGENCIA 2012

MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION	ESTADO
SANTANDER	Suministro de mobiliario de recreación urbano en varios municipios del Departamento de Santander	\$ 547.682.400,00	Margen de Comercialización	LIQUIDADO

TOTAL INVERSIÓN EN CONTRATOS \$ 8.749.097.155,19

Programa Modernización de la Infraestructura del Equipamiento Urbano

PROYECTOS REGALIAS DIRECTAS OCAD 2012

MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION	ESTADO
ARATOCA	Construcción acuaparque nacional del Chicamocha centro oriente, Santander, Aratoca	\$ 7.754.953.849,98	Asignaciones Directas (SGR)	EN EJECUCION 5%
ARATOCA	Interventoria construcción acuaparque nacional del Chicamocha centro oriente, Santander, Aratoca	\$ 384.528.018,00	Asignaciones Directas (SGR)	EN EJECUCION 5%
BARRANCABERMEJA	Construcción parque interactivo, Centro Oriente, Santander, Barrancabermeja	\$ 5.000.000.000,00	Asignaciones Directas (SGR)	TRAMITE LICENCIA DE CONSTRUCCION
BUCARAMANGA	Mantenimiento y adecuación del estadio Alfonso López del municipio de Bucaramanga – Departamento de Santander	\$ 4.782.925.610,07	Asignaciones Directas (SGR)	EN EJECUCION 5%
BUCARAMANGA	Interventoría para el mantenimiento y adecuación del estadio Alfonso López del municipio de Bucaramanga – Departamento de Santander	\$ 262.177.647,00	Asignaciones Directas (SGR)	EN EJECUCION 5%

PROYECTOS REGALIAS DIRECTAS OCAD 2012

MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION	ESTADO
FLORIDABLANCA	Obra civil enmarcada dentro del proyecto construcción del ecoparque cerro del santísimo en el municipio de Floridablanca Santander, centro oriente	\$ 19.003.855.040,75	Asignaciones Directas (SGR)	POR INICIAR
FLORIDABLANCA	Construcción de un sistema de transporte de pasajeros por cable aéreo tipo telecabina monocable desenganchable (suministro, transporte y construcción de un sistema de transporte funcionando, incluyendo una etapa de garantía de operación), enmarcado dentro del proyecto "construcción del ecoparque cerro del santísimo en el municipio de Floridablanca Santander, centro oriente	\$ 21.227.453.621,00	Asignaciones Directas (SGR)	EN LEGALIZACION CONTRATO

PROYECTOS REGALIAS DIRECTAS OCAD 2012

MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION	ESTADO
FLORIDABLANCA	Ejecución de trabajo artístico enmarcado dentro del proyecto “construcción del ecoparque cerro del santísimo en el municipio de Floridablanca Santander, centro oriente”	\$ 3.525.775.000,00	Asignaciones Directas (SGR)	EN EJECUCION 15%
FLORIDABLANCA	Interventoría de la construcción del ecoparque cerro del santísimo del municipio de Floridablanca - departamento de Santander	\$ 1.293.552.405,45	Asignaciones Directas (SGR)	POR INICIAR
FLORIDABLANCA	Construcción del parque acuatico El Lago – Acualago del municipio de Floridablanca – Departamento de Santander	\$ 2.500.000.000,00	Asignaciones Directas (SGR)	PROCESO PRECONTRACTUAL

TOTAL INVERSION OCAD
\$ 65.735.221.192,25

AVANCE DE METAS EN ELECTRIFICACION PLAN DE DESARROLLO A MAYO 31 DE 2012

META DE PRODUCTO	ESPERADO CUATRIENIO	PROGRAMADO 2012	EJECUTADO 2012
Gestionar, apoyar y promover 2 proyectos de generación de energía hidráulica en Santander.	2	0	0
Promover la adecuación o construcción de 2 centrales hidroeléctricas de baja generación en el departamento para dar apoyo, respaldo y confiabilidad al sistema de transmisión regional y a las finanzas del departamento.	2	0	0
Conectar a 6.000 usuarios a la electrificación rural en Santander.	6.000	1.085	1.055
Abastecer de energía no convencional (fotovoltaica) a 300 viviendas del departamento.	300	0	0
Apoyar, promover y gestionar 10 proyectos de energía no convencional (fotovoltaica, eólica, biomasa, biogestores u otras proyectos de energía alternativa) para el Departamento de Santander.	10	0	0
Diseñar, formular e implementar la Política Pública Minero Energética para el Departamento de Santander.	1	0	0

PROYECTOS CONTRATADOS RECURSOS 2012

ELECTRIFICACION RURAL			
CONVENIOS CELEBRADOS CON LA VIGENCIA 2012			
MUNICIPIO	OBJETO	ESTADO	APORTE DEPARTAMENTO
GAMBITA	CONSTRUCCION DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDAS LA CARRERA- EL CALVARIO Y OTRAS DEL MUNICIPIO DE GAMBITA, SANTANDER	EJECUCION 20%	434.396.130,00
LANDAZURI	CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJES DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDA RIO BLANCO ALTO DEL MUNICIPIO DE LANDAZURI SANTANDER	POR ADJUDICAR EL MUNICIPIO	1.074.735.869,00
CIMITARRA	CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENCION, ALUMBRADO PUBLICO Y SUBESTACIONES PARA LA ELECTRIFICACION DEL SECTOR NUEVA CIMITARRA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA - SANTANDER	POR ADJUDICAR EL MUNICIPIO	623.399.943,87
CHIPATA	ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS SAN MIGUEL EL PAPAYO - TUBABITA - LLANO DE SAN JUAN - EL BATAN - MULATAL - CENTRO - TOROBA - EL HATILLO - AGATA - TIERRA NEGRA - SALITRE SECO Y OTRAS DEL MUNICIPIO DE CHIPATA - SANTANDER	EJECUCION 18%	443.208.450,00
PUERTO PARRA	CONSTRUCCION DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE DE TRASFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LA VEREDA EL BOROJO - FASE 1 - DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, SANTANDER	POR ADJUDICAR EL MUNICIPIO	1.298.412.663,03
TOTAL:			3.874.153.055,90

PROYECTOS CONTRATADOS RECURSOS 2012

ELECTRIFICACION RURAL			
CONTRATOS CELEBRADOS CON RECURSOS VIGENCIA 2012			
MUNICIPIO	OBJETO	APOORTE DEPARTAMENTO	ESTADO
CERRITO - ONZAGA	CONSTRUCCION DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION Y MONTALE DE TRANSFORMADORES PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LA VEREDA EL RAMAL DEL MUNICIPIO DE ONZAGA Y LAS VEREDAS BOYACA-	975.771.799,00	EJECUCION 15%
ONZAGA - CERRITO - CHIPATA - GAMBITA - CIMITARRA - LANDAZURI - PUERTO PARRA	INTERVENTORIA PROYECTOS ELECTRIFICACION ONZAGA, CERRITO, CHIPATA, GAMBITA CIMITARRA, LANDAZURI Y PUERTO PARRA	251.623.319,75	EJECUCION 10%
TOTAL		1.227.395.519,00	

AVANCE DE METAS PLAN DE DESARROLLO CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2012

**LINEA ESTRATEGICA
EQUILIBRADO Y
ORDENADO.**

**PROGRAMA
Masificación de
Gas.**

**Objetivo: Ampliar
la cobertura de
servicio de gas
domiciliario en el
departamento de
Santander.**

**-Apoyar la conexión
a 20.000 usuarios.
-Avance del 36%**

ITEM	PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	GOBERNACION	USUARIOS	VALOR TOTAL PROYECTO
1	BETULIA	ESTADO 70%	242.606.000	496	1.678.104.647
2	AGUADA	ESTADO 70%	89.020.750	182	971.237.931
3	LANDAZURI	ESTADO 70%	373.202.375	763	1.947.597.096
4	MALAGA	ESTADO 50%	1.324.550.500	3480	5.447.597.096
5	LOS SANTOS	ESTADO 0%	189.780.500	388	1.578.104.647
6	ARATOCA	ESTADO 80%	292.007.625	597	1.600.104.647
7	MOGOTES	ESTADO 80%	631.949.500	1292	2.647.597.096
TOTAL			3.143.117.250	7198	15.870.343.160

VALOR DEL SUBSIDIO \$489.125

VALOR COMPROMETIDO \$3.782.508.294.00



ESTADO DEL PROYECTO ANILLO VIAL DE RUITOQUE CON CORTE A MAYO 31 DE 2013

LINEA
ESTRATEGICA DE
CONECTIVIDAD.

PROGRAMA:
Modernización de
la infraestructura
de Transporte Red
Vial Municipal.

PROYECTO ANILLO VIAL
DE RUITOQUE LONGITUD
23 KILOMETROS. HACEN
FALTA POR CONCLUIR 1.5
KILOMETROS

SE HA RECAUDADO EL 92% DE LOS RECURSOS



\$7.824.280.949

COBRO COACTIVO RECUPERADO



\$184.007.911

EN PROCESO 209 PREDIOS



\$431.071.977

SE GESTIONAN LOS RECURSO PARA CULMINAR LA
OBRA ANILLO VIAL DE RUITOQUE



\$1.700.000.000

SALDO POR COBRAR
DE VALORIZACION SIN INCLUIR COBRO COACTIVO



\$2.958.107.446

TOTAL VALORIZACION-CARTERA



\$3.389.179.323

GOBIERNO DE *la gente*

VIA ANILLO VIAL DE RUITOQUE



ATENCION DE EMERGENCIAS

El objetivo de este programa es brindar transito continuo a través de los bancos de maquinaria y de las empresas privadas.



CONSTRUCCION MURO EN LA VIA SUAITA-VADOREAL



ADECUACION DEL PASO EN LA QUEBRADA LA INSULA VIA ENCISO-CARCASI



RECUPERACION DE LA BANCA VIA AGUASUCIA-SAN MIGUEL



CONSTRUCCION VARIANTE EN LA VIA CAPITANEJO-PUENTE LATA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Retiro de derrumbes
- Estabilización de taludes
- Construcción de jarillones
- Encausamiento de ríos

CUMPLIMIENTO DE METAS PDD 2012-2015 - VIAS SECUNDARIAS

PROGRAMA	META DE PRODUCTO	NOMBRE INDICADOR	ESPERADO CUATRIENIO	PROGRAMADO 2012	EJECUTADO O 2012	% EJECUCION 2012
Modernización de la Infraestructura de Transporte de la Red Secundaria.	Mejorar 500 kilómetros y/o pavimentar 50 Km de la red vial secundaria e incrementar los niveles de señalización y seguridad vial, por inversión pública y/o privada.	Nº de km mejorados y/o pavimentados	93	0	9,29	929,0%
	Realizar mantenimiento rutinario a 1.100 kilómetros de la red vial secundaria.	Nº de kilómetros mantenidos.	1.300	300	300	100,0%
	Realizar mantenimiento periódico a 1.210 kilómetros de la red vial secundaria.	Nº de kilómetros mantenidos.	2.210	150	121,19	80,8%
	Gestionar y elaborar 10 estudios y diseños de infraestructura de transporte.	Nº de estudios gestionados y elaborados.	160	0	0	0,0%
	Mejorar e implementar el sistema de información de infraestructura vial secundaria del departamento.	No de sistemas mejorados e implementado.	1	1	0,5	50,0%
Modernización de la Infraestructura de Transporte - Puentes de la Red secundaria	Apoyar la construcción, mejoramiento y/o conservación de 700 mts de puentes de la red secundaria	Nº de metros de puentes construidos, mejorados y conservados.	1.000	200	20,3	10,2%
	Gestionar y elaborar 5 estudios y diseños de infraestructura de puentes.	Nº de estudios gestionados y elaborados.	7	0	0	0,0%

MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA RED SECUNDARIA			
ADICIONALES A CONTRATOS Y CONVENIOS VIGENCIAS ANTERIORES			
MUNICIPIO	OBJETO	APORTE DEPARTAMENTO	ESTADO
BUCARAMANGA	REHABILITACION DE LA VIA BUCARAMANGA - MATANZA SECTOR LA VIRGEN BOSCONIA DEL K0+000 AL K5+556 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEPARTAMENTO DE SANTANDER '	822.625.359,07	TERMINADO
BUCARAMANGA	INTERVENTORIA, REHBILITACION DE LA VIA BUCARAMANGA - MATANZA, SECTOR LA VIRGEN - BOSCONIA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER".'	139.998.080,00	TERMINADO
CHIMA - GUAPOTA	INTERVENTORIA, A LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN IGNACIO SOBRE EL RIO SUAREZ, EN LA VIA SECUNDARIA CHIMA - GUAPOTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER". RECURSOS PROVENIENTES DE CREDITO INTERNO FINDETERVIAS	39.957.708,00	SUSPENDIDO
ENCISO - CARCASI	INTERVENTORIA MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA ENCISO-CARCASI, SECTOR 1, (MUNICIPIO DE ENCISO: 4 KM), SECTOR 2 (MUNICIPIO CARCASI 2.19 KM) DEPARTAMENTO DE SANTANDER'	29.028.420,00	TERMINADO
HATO-PALMAR	"INTERVENTORIA - MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA HATO PALMAR, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"	129.999.999,62	TERMINADO
SANTA BARBARA	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LAS VIAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMETNO DE SANTANDER (TOPE - SANTABARBARA)	113.461.509,43	TERMINADO
ZAPATOCA	"INTERVENTORIA MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA GIRON-ZAPATOCA-DEPARTAMENTO DE SANTANDER"	70.000.000,00	LIQUIDADO
ZAPATOCA	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA GIRON-ZAPATOCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER'	1.000.000.000,00	LIQUIDADO
TOTAL		2.345.071.076,12	

MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA RED SECUNDARIA

CONVENIOS CELEBRADOS CON RECURSOS DE LA VIGENCIA 2012

MUNICIPIO	OBJETO	APOORTE DEPARTAMENTO	ESTADO
CABRERA	ATENCION DE EMERGENCIA VIA SAN GIL - CABRERA	49.998.500,00	LIQUIDADO
CAPITANEJO	ATENCION DE EMERGENCIA VIA CAPITANEJO PUENTE LATA DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO DEPARTAMENTO DE SANATANDER	24.996.910,00	LIQUIDADO
CARMEN DE CHUCURI	ATENCION DE EMERGENCIA VIA CABECERA MUNICIPAL - CAÑAVERALES - EL CUARENTA - EL TOBOSO - LA FORTUNA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI	99.990.000,00	LIQUIDADO
COROMORO	ATENCION EMERGENCIA EN LA VIA CHARALA - COROMORO KM 2, SECTOR LOMA DE PISGUA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER	14.999.310,00	TERMINADO
GUACAMAYO	APOYO A LA ATENCION DE EMERGENCIA Y REHABILITACION DE LA RED VIAL MUNICIPAL VIA EL GUACAMAYO - SANTA HELENA DEL OPON	149.997.500,00	LIQUIDADO
LEBRIJA	ATENCION DE LA EMERGENCIA - REHABILITACION DE LA VIA AZUFRADA - SABANA DE TORRES EN EL SECTOR CRITICO DEL PUENTE ROJO SOBRE EL RIO SUCIO CON LA CONSTRUCCION DE ACCESO Y OBRAS DE DRENAJE CONTINUAS AL PUENTE -MUNICIPIO DE LEBRIJA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER	300.000.000,00	TERMINADO
MACARAVITA	ATENCION DE LA EMERGENCIA EN LA VIA MACARAVITA - CAPITANEJO SECTOR PUENTE LATA - SANTANDER	29.990.000,00	TERMINADO
SAN VICENTE DE CHUCURI	ATENCION DE EMERGENCIA Y REHABILITACION VIA SAN VICENTE DE CHUCURI - EL CARMEN DE CHUCURI DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	99.930.000,00	LIQUIDADO
SANTA HELENA DEL OPON	ATENCION DE LA EMERGENCIA - EN LA VIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO CACHAPAY CON EL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON - SANTANDER	19.991.444,00	LIQUIDADO
TOTAL		789.893.664,00	

MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA RED SECUNDARIA
CONTRATOS CELEBRADOS CON RECURSOS DE LA VIGENCIA 2012

MUNICIPIO	OBJETO	APORTE DEPARTAMENTO	ESTADO
CEPITA	INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DE LA SUPERFICIE VIAL DE LA VIA PESCADERO - CEPITA, DESDE EL ACCESO POR LA TRONCAL CENTRAL HASTA EL PUENTE SOBRE EL RIO CHICAMOCHA, EN EL MUNICIPIO DE CEPITA.	55.355.200,00	TERMINADO
DEPARTAMENTO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PRIORITARIOS PARA LA INVERSION DEPARTAMENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER-ESTUDIOS Y DISEÑOS PRIORITARIOS PARA LA INVERSION DEPARTAMENTAL EN EQUIPAMIENTO URBANO DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER-ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE PUENTES PRIORITARIOS DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER-ESTUDIOS, DISEÑOS Y ASESORIA PARA LA PAVIMENTACION, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE TRAMOS VIALES PRIORITARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	1.699.017.436,00	EJECUCION(50%)
DEPARTAMENTO	GERENCIAR, ADMINISTRAR Y EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO ¿MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DEPARTAMENTO DE SANTANDER PROGRAMA CAMINEROS POR SANTANDER	1.615.383.573,12	POR INICIAR
DEPARTAMENTO	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. (INCLUYE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, OPERACIÓN, TRANSPORTE, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS)	37.370.337.700,00	EN IMPORTACION DE MAQUINAS)
DEPARTAMENTO	INTERVENTORIA TECNICO, ADMINISTRATIVA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. (INCLUYE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, OPERACIÓN, TRANSPORTE, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS)	569.887.120,00	POR INICIAR
FLORIDABLANCA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR VIAL, VIA ANTIGUA BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA DESDE EL SECTOR ALEDAÑO AL COLEGIO VICENTE AZUERO (BARRIO BUCARICA) BARRIO BELLA VISTA - BARRIO ROSALES - BARRIO SANTA ANA - FASE I	453.727.481,00	SUSPENDIDO
GALAN	ATENCION EMERGENCIA - REHABILITACION EN EL SITIO CRITICO UBICADO SOBRE LA VIA GALAN EL PALMAR SECTOR QUEBRADA LA HONDA	45.524.555,55	TERMINADO
LA PAZ	ATENCION DE EMERGENCIA CONSERVACION DE PUENTE SOBRE LA QUEBRADA "LA PITALES" DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	44.148.645,00	LIQUIDADO
TOTAL		41.853.381.710,67	

MEJORAMIENTO DE VIAS

Se elevó el nivel de servicio de algunas vías, brindando mayor transitabilidad a través de construcción de Muros de contención, construcción de obras de drenaje y mejoramiento en su superficie de rodadura.



MURO EN LA VIA SUAITA-VADO REAL



BOX RIO NEGRO LLANO DE PALMAS

CUMPLIMIENTO DE METAS PDD 2012-2015 - VIAS MUNICIPALES

PROGRAMA	META DE PRODUCTO	NOMBRE INDICADOR	ESPERADO CUATRIENIO	PROGRAMADO 2012	EJECUTADO 2012	% EJECUCION 2012	PROGRAMADO 2013
Modernización de la Infraestructura de Transporte a la Red Municipal	Apoyar la construcción, mejoramiento y/o conservación de 300 mts de puentes de la red terciaria	Nº de metros de puentes apoyados	345	25	139	556,0%	100
	Realizar un convenio para apoyar financieramente la consolidación del sistema masivo de transporte en el Área Metropolitana de Bucaramanga con el fin de mejorar la accesibilidad de los usuarios a los medios de transporte.	Convenio realizado.	1	0	1	100,0%	1
	Apoyar el mejoramiento de 5.000 metros cuadrados de la red urbana municipal.	Nº de metros cuadrados apoyados y mejorados.	25.000	400	830	207,5%	1600
	Apoyar el mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de 200 kilómetros de la red vial terciaria.	Nº de Km apoyados y mejorados.	500	50	11,4	22,8%	50
	Gestionar y elaborar 1 estudio y diseño por vía contribución de valorización.	Estudio gestionado y elaborado.	2	0	0	0,0%	1
	Mejorar 10 kilómetros de vías municipales a través de la contribución de valorización.	Nº de kilómetros mejorados.	22	0	0	0,0%	5
	Apoyar la construcción de 2 intercambiadores de tráfico.	Nº de intercambiadores de tráfico apoyados.	2	1	1	100,0%	1

MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA RED VIAL MUNICIPAL			
ADICIONALES A CONTRATOS Y CONVENIOS VIGENCIAS ANTERIORES			
MUNICIPIO	OBJETO	APORTE DEPARTAMENTO	ESTADO
BARRANCABERMEJA	CONEXION VIAL TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO- PUENTE GUILLERMO GAVIRIA CORREA (COMPROMISO VIGENCIAS FUTURAS)	8.000.000.000,00	EJECUCION
SOCORRO	"CONSTRUCCION HUELLAS VEHICULARES VEREDA EL RINCON, MUNICIPIO DE SOCORRO- DEPARTAMENTO DE SANTANDER". '	268.361.375,40	TERMINADO
SOCORRO	INTERVENTORIA. CONSTRUCCION HUELLAS VEHICULARES VEREDA EL RINCON , MUNICIPIO DE SOCORRO- DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	12.600.000,00	LIQUIDADO
SUAITA	REPARACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA VIA A LA VEREDA TOLOTA MUNICIPIO DE SUAITA.	107.000.000,00	TERMINADO
SUAITA	INTERVENTORIA. REPARACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA VIA A LA VEREDA TOLOTA MUNICIPIO DE SUAITA	5.000.000,00	TERMINADO
TOTAL		8.392.961.375,40	

MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA RED VIAL MUNICIPAL
CONVENIOS CELEBRADOS CON RECURSOS DE LA VIGENCIA 2012

MUNICIPIO	OBJETO	APORTE DEPARTAMENTO	ESTADO
AREA METROPOLITANA	AUNAR ESFUERZOS PARA APLICACION DE LA ESTRATEGIA VALORES SOBRE RUEDAS PARA LA DIFUSION DE HABITOS ADECUADOS DE CULTURA CIUDADANA A TRAVES DEL TRANSPORTE MASIVO METROLINEA EN EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	80.000.000,00	TERMINADO
CHARTA	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SURATA EN LA VIA QUE COMUNICA A LA VEREDA PERICOS MUNICIPIO DE CHARTA SANTANDER	887.076.436,00	EJECUCION (20%)
EL PALMAR	APOYO A LA ATENCION DE LA EMERGENCIA - CONSERVACION PUENTE COMUNEROS VIA PALMAR - SOCORRO VEREDA CINCO MIL DEL MUNICIPIO DE PALMAR - SANTANDER	347.962.177,00	TERMINADO
EL PLAYON	APOYO ATENCION DE EMERGENCIAS Y REHABILITACION DE LA RED VIAL MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYON DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	99.995.000,00	TERMINADO
ENCISO	APOYO A LA ATENCION DE LA EMERGENCIA - EN LA RED VIAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ENCISO - SANTANDER	15.000.000,00	TERMINADO
FLORIDABLANCA	ADQUIRIR PREDIOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR DEL BOSQUE (PASO ELEVADO) DEL PROYECTO VIAL TRANSVERSAL DEL BOSQUE	1.500.000.000,00	EJECUCION (80%)
GAMBITA	ATENCION DE LA EMERGENCIA - REHABILITACION PUENTE EL HATO VEREDA VIJAGUAL Y PUENTE VEREDA PORQUERAS SOBRE EL RIO GAMBITA DEL MUNICIPIO DE GAMBITA	52.525.036,00	EJECUCION (60%)
GIRON	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION VIA PUENTE BAHONDO - CIUDADELA NUEVO GIRON DEL MUNICIPIO DE GIRON-DEPARTAMENTO DE SANTANDER	400.000.000,00	PROCESO LICITATORIO
LANDAZURI	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA QUE COMUNICA A LA VEREDA PORTONES CON EL ESPINAL, MUNICIPIO DE LANDAZURI, SANTANDER	39.978.706,00	PROCESO LICITATORIO



MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA RED VIAL MUNICIPAL

CONVENIOS CELEBRADOS CON RECURSOS DE LA VIGENCIA 2012

MUNICIPIO	OBJETO	APORTE DEPARTAMENTO	ESTADO
LEBRIJA	CONSTRUCCION DE 210 ML EN PAVIMENTO FLEXIBLE VIA RANCHO JUY - LA LAGUNA MUNICIPIO DE LEBRIJA	203.286.510,00	PROCESO MUNICIPIO
LEBRIJA	APOYO A LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y REHABILITACION DE LA RED VIAL MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA DEPARTAMENTO SANTANDER	149.994.000,00	LIQUIDADO
MALAGA	CONSTRUCCION PLACA HUELLAS VEHICULOS EN CONCRETO HIDRAULICO, VEREDA BUENAVISTA MUNICIPIO DE MALAGA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	56.281.690,00	EJECUCION 60%
ONZAGA	APOYO ATENCION DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ONZAGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	69.999.750,00	TERMINADO
RIONEGRO	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SALAMAGA VEREDA FLORENCIA CABALLITO MUNICIPIO DE RIONEGRO DEPARTAMENTO DE SANTANDER	546.789.502,24	PROCESO MUNICIPIO
SABANA DE TORRES	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SABANA DE TORRES - LOS PINOS, SABANA DE TORRES SANTANDER	380.281.690,00	PROCESO MUNICIPIO
SAN GIL	REHABILITACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 24 ENTRE CARRERAS 14 Y 14A Y LA CRA 13 ENTRE CALLES 24 Y 25 DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER	249.845.422,00	PROCESO MUNICIPIO
SANTA HELENA DEL OPON	APOYO ATENCION DE EMERGENCIAS Y REHABILITACION VIAL MUNICIPAL MEDIANTE ENCAUSAMIENTO DE LA QUEBRADA LA VERDE DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON.	49.998.000,00	LIQUIDADO
SUCRE	APOYO A LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y REHABILITACION DE LA RED VIAL MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DE SANTANDER	124.998.500,00	EJECUCION 30%
TONA	APOYO A LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y REHABILITACION DE LA RED VIAL MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TONA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	99.999.500,00	TERMINADO
TOTAL		5.354.011.919,24	

LINEA ESTRATÉGICA SANTANDER SUSTENTABLE

PROGRAMA	META DE PRODUCTO	NOMBRE DE INDICADOR	PROGRAMADO 2012	EJECUTADO 2012	% EJECUCIÓN META	PROGRAMADO 2013
Asistencia Técnica y Equipamiento para Mejorar la Calidad del Agua	Capacitar, asesorar y orientar a 30 entidades administradoras de servicios públicos domiciliarios (empresas y/o municipios) en áreas legales, técnicas, administrativas y comerciales.	Nº de entidades capacitadas, asesoradas y orientadas.	10	10	100.0%	10
	Adquirir 20 equipos de laboratorio para el muestreo, diagnóstico y cuantificación de la calidad y cantidad del agua.	Nº de equipos de laboratorio adquiridos.	5	0	0.0%	5
	Realizar en 40 acueductos el diagnóstico de la calidad del agua tanto en la fuente como en el punto final de tratamiento y/o entrega del suscriptor.	Nº. de acueductos con diagnóstico realizado.	10	10	100.0%	10



MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA RED VIAL MUNICIPAL			
CONTRATOS CELEBRADOS CON RECURSOS DE LA VIGENCIA 2012			
MUNICIPIO	OBJETO	APORTE DEPARTAMENTO	ESTADO
CHARTA	INTERVENTORIA. CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SURATA EN LA VIA QUE COMUNICA A LA VEREDA PERICOS MUNICIPIO DE CHARTA SANTANDER	45.996.556,00	EJECUCION
CONFINES	ATENCION DE EMREGENCIA, REHABILITACION RED VIAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE BOX COULVERT EN LAS VEREDAS PALMAR - SALITRE, MUNICIPIO DE CONFINES DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	44.720.353,13	LIQUIDADO
GAMBITA	ESTUDIO GEOLOGICO Y DE ESTABILIDAD DE TALUDES Y DISEÑO DE OBRAS DE REMEDIACION DE UNA ZONA DE DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR URBANO DE GAMBITA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	49.999.712,00	PROCESO MUNICIPIO
JORDAN - LOS SANTOS	ATENCION DE EMERGENCIA RED VIAL REALCE DE LOS ESTRIBOS DEL PUENTE COLGANTE UBICADO ENTRE LOS MUNICIPIO DE JORDAN Y LOS SANTOS DEPARTAMENTO DE SANTANDER	26.967.600,00	TERMINADO
PIEDECUESTA	APOYO ATENCION A LA EMERGENCIA REHABILITACION RED VIAL MUNICIPAL VIA PIEDECUESTA - SEVILLA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	53.125.470,00	LIQUIDADO
RIONEGRO	INTERVENTORIA CONSTRUCCION VEHICULAR SOBRE EL RIO SALAMAGA VEREDA FLORENCIA CABALLITO MUNICIPIO DE RIONEGRO DEPARTAMENTO DE SANTANDER	28.652.048,47	PROCESO CONTRACTUAL
RIONEGRO	CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO CACHIRA ANTIGUO CAÑO 10 SECTOR LA PLATANALA, BAJO RIONEGRO, MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER	431.737.213,00	EJECUCION (5%)
RIONEGRO	INTERVENTORIA PARA CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO CACHIRA ANTIGUO CAÑO 10 SECTOR LA PLATANALA, BAJO RIONEGRO, MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER	29.454.720,00	EJECUCION (5%)
SANTA HELENA - LA PAZ - CHIMA - CONFINES	ATENCION A LA EMERGENCIA - REHABILITACION DE LOS CORREDORES VIALES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER VIA GUALILO - SANTA HELENA DEL OPO, VIA LA PAZ - SECTOR DE MIRABUENOS, VIA CHIMA - CONTRATACION Y VIA CONFINES - PARAMO EN EL SECTOR PUENTE LA CHAVEZ	296.958.253,00	EJECUCION (90%)
TOTAL		1.007.611.925,60	

CONSTRUCCION DEL ECOPARQUE CERRO EL SANTISIMO



MEGAPROYECTOS

Obra civil enmarcada dentro del Proyecto
Construcción del Ecoparque Cerro Del
Santísimo

\$19.003'855.040,75

Construcción de un sistema de transporte de
pasajeros por cable aéreo tipo telecabina
monocable desenganchable (suministro,
transporte y construcción de un sistema de
transporte funcionando, incluyendo una etapa
de garantía de operación.

\$21.227'453.621.

Ejecución de trabajo artístico.

\$3.525'775.000.

**CONSTRUCCIÓN DEL
ECOPARQUE CERRO
DEL SANTÍSIMO**

Interventoria.

\$1.293'552.405,45

**CONSTRUCCION DEL ECOPARQUE CERRO EL SANTISIMO
MUNICIPIO FLORIDABLANCA**

MEGAPROYECTOS

**MEGALUDOTECA
CONSTRUCCION PARQUE
INTERACTIVO, CENTRO ORIENTE,
SANTANDER, BARRANCABERMEJA**

\$11.500'.000.000

EN TRAMITE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION.

LOS RECURSOS ESTAN GARANTIZADOS A TRAVES
DEL SGR VIGENCIA 2012.


APORTES:

EL DEPARTAMENTO APORTA **\$5.000** MILLONES.

ECOPETROL \$1.500 MILLONES.

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
\$5.000 MILLONES REPRESENTADOS EN EL PREDIO

MEGAPROYECTOS

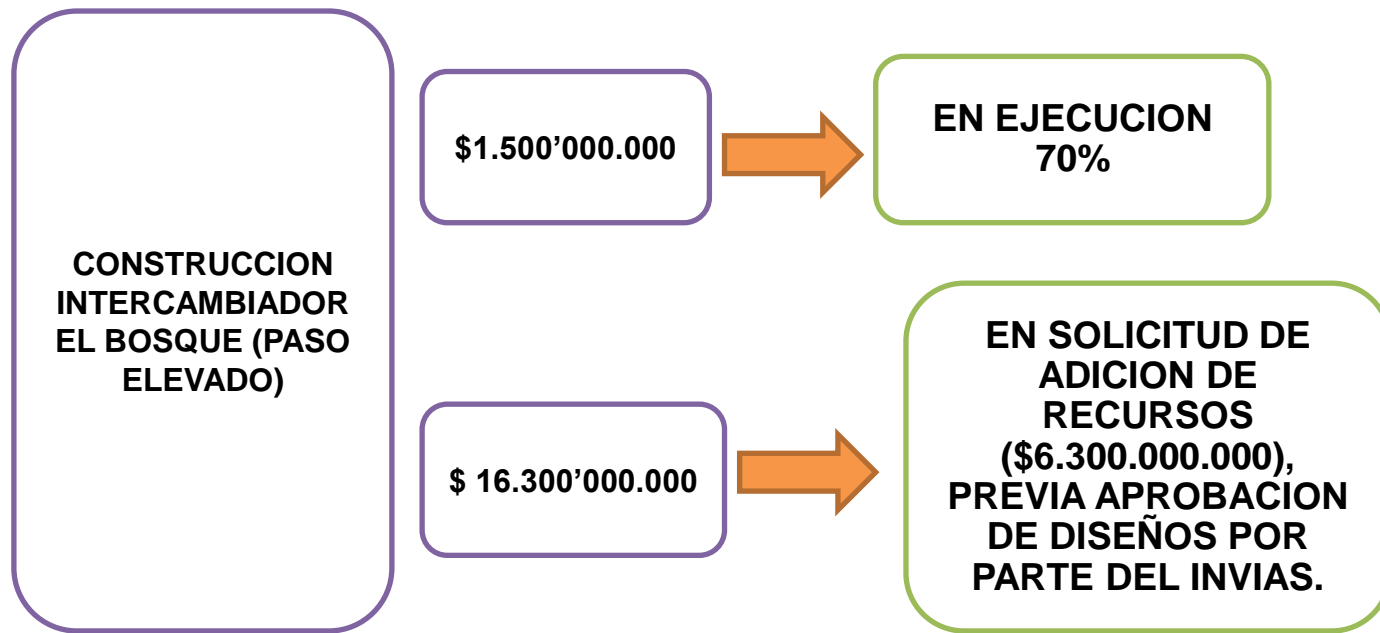

MEGAPROYECTOS

**CONSTRUCCIÓN ACUAPARQUE
NACIONAL DEL CHICAMOCHA CENTRO
ORIENTE, SANTANDER, ARATOCA.**

\$8.139.481.868



EN EJECUCION

**PREVENCION Y ATENCION DE
EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTO
PERIODICO DE LA MALLA VIAL DEL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
(INCLUYE LA ADQUISICION DE
EQUIPOS, OPERACIÓN, TRANSPORTE,
ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO
DE LOS MISMOS).**

\$37.953'759.840.



**EN EJECUCION
(IMPORTACION
DE
MAQUINAS).**

- Julio
- Agosto
- Octubre

MEGAPROYECTOS

**MANTENIMIENTO VIAS SECUNDARIAS
DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
"CAMINEROS"**

\$ 4.113'467.601.



ACTA DE INICIO (19 de Junio).

**CENTRO DE CONVENCIONES DE
BUCARAMANGA**

Valor Total: \$50.000.000.000

\$ 10.000'000.000

(APORTE DEPARTAMENTO)



**EL DEPARTAMENTO APORTA LA SUMA DE
\$10.000 MILLONES, CON RECURSOS DE
COMPENSACION DE REGALIAS DIRECTAS.**

**EL MUNICIPIO ADELANTA LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS, A TRAVES DE CONSULTORIA
APORTA \$15.000. MILLONES**

EL MIC APORTA \$10.000 MILLONES.

FONTUR APORTA \$10.000.MILLONES.

DNP APORTA \$5.000 MILLONES



MEGAPROYECTOS

**MANTENIMIENTO Y ADECUACION
ESTADIO ALFONSO LÓPEZ DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (Incluye
Estudio de Vulnerabilidad sismica)
\$6477.458.560.00**



**ANALISIS DE VULNERABILIDAD
SISIMICA. \$1.433.004.840.
MANTENIMIENTO
REPARACIONES LOCATIVAS
\$4.782.925.610.
INTERVENTORIA. \$261.568.110**

**CONSTRUCCION DEL PARQUE
ACUATICO EL LAGO – ACUALAGO DEL
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
\$ 2.500'000.000.**



**EN REVISION DE CANTIDADES EN
SITIO DE OBRA, PARA INICIAR
PROCESO PRECONTRACTUAL
RECURSOS GARANTIZADOS DE
REGALIAS DIRECTAS VIGENCIA
2012.**





GRACIAS
